Nr.	Task Name	Dauer	Anfang	Ende	Nachfolger	Vorgänger
1	SuperKEKB IP design fixed	0 Tage	Fr 01.10.10	Fr 01.10.10	61	
2	Belle II TDR	0 Tage	Mi 31.03.10	Mi 31.03.10	244;255;	
3	PXD FDR I (ASIC, Sensor)	0 Tage	Fr 13.05.11	Fr 13.05.11	95;105;118;117	90
4	PXD FDR II (System)	0 Tage	Do 29.03.12	Do 29.03.12	307;308;309;265	303;320
5	**1.0 DEPFET Detector**	**1486 Tage?**	**Mi 09.07.08**	**Mi 19.03.14**		
6	**1.1 Parameter Definitions**	**607 Tage?**	**Do 01.01.09**	**Fr 29.04.11**		
8	**1.2 Pixel Sensor**	**1456 Tage?**	**Mi 09.07.08**	**Mi 05.02.14**		
83	**1.3 ASIC**	**1103 Tage?**	**Di 11.11.08**	**Do 31.01.13**		
129	**1.4 Module**	**961 Tage?**	**Di 26.05.09**	**Di 29.01.13**		
130	**1.4.1 Sensor ladder R&**	**961 Tage?**	**Di 26.05.09**	**Di 29.01.13**		
131	Dummy Sensor (me	0,5 Monate	Di 26.05.09	Mo 15.03.10	133;134	23
132	Dummy Sensors (el	3 Monate	Fr 01.01.10	Do 25.03.10	133;125	23
133	Dummy Modules (m	2 Monate	Fr 26.03.10	Do 20.05.10	261;125	132;131
134	Module to ladder joi	6 Monate	Di 16.03.10	Mo 30.08.10	135;261	131
135	Prototyp Module	3 Monate	Fr 11.11.11	Do 02.02.12	136;137	102;134;37;123
136	Prototype available	0 Tage	Do 02.02.12	Do 02.02.12	104;258	135
137	Production Preparat	258 Tage?	Fr 03.02.12	Di 29.01.13		135
138	**Ladder Assembly**	**193 Tage**	**Mo 24.06.13**	**Mi 19.03.14**		
139	**Sensor Assembly (Flip**	**183 Tage**	**Mo 24.06.13**	**Mi 05.03.14**		**81**
140	modules (2) for i1	2 Wochen	Mo 24.06.13	Fr 05.07.13	141;166	81;73
141	modules (2) fos i2	2 Wochen	Mo 08.07.13	Fr 19.07.13	142;167	140
142	modules (2) for i3	2 Wochen	Mo 22.07.13	Fr 02.08.13	143;168	141
143	modules (2) for i4	2 Wochen	Mo 05.08.13	Fr 16.08.13	144;169	142
144	moduels (2) for i5	2 Wochen	Mo 19.08.13	Fr 30.08.13	145;170	143
145	modules (2) for i6	2 Wochen	Mo 02.09.13	Fr 13.09.13	146;171	144
146	modules (2) for i7	2 Wochen	Mo 16.09.13	Fr 27.09.13	147;172	145
147	modules (2) for i8	2 Wochen	Mo 30.09.13	Fr 11.10.13	173;148	146
148	modules (2) for ir1	1 Woche	Mo 14.10.13	Fr 18.10.13	149;174	147
149	modules (2) for ir2	1 Woche	Mo 21.10.13	Fr 25.10.13	150;175	148
150	modules (2) for ir3	1 Woche	Mo 28.10.13	Fr 01.11.13	151;176	149
151	modules (2) for o1	1 Woche	Do 28.11.13	Mi 04.12.13	152;177	150;82
152	modules (2) for o2	1 Woche	Do 05.12.13	Mi 11.12.13	153;178	151
153	modules (2) for o3	1 Woche	Do 12.12.13	Mi 18.12.13	154;179	152
154	modules (2) for o4	1 Woche	Do 19.12.13	Mi 25.12.13	155;180	153
155	modules (2) for o5	1 Woche	Do 26.12.13	Mi 01.01.14	156;181	154
156	modules (2) for o6	1 Woche	Do 02.01.14	Mi 08.01.14	157;182	155
157	modules (2) for o7	1 Woche	Do 09.01.14	Mi 15.01.14	158;183	156
158	modules (2) for o8	1 Woche	Do 16.01.14	Mi 22.01.14	159;184	157
159	modules (2) for o9	1 Woche	Do 23.01.14	Mi 29.01.14	160;185	158
160	modules (2) for o10	1 Woche	Do 30.01.14	Mi 05.02.14	161;186	159
161	modules (2) for o11	1 Woche	Do 06.02.14	Mi 12.02.14	162;187	160
162	modules (2) for o12	1 Woche	Do 13.02.14	Mi 19.02.14	163;188	161
163	modules (2) for or1	1 Woche	Do 20.02.14	Mi 26.02.14	164;189	162
164	modules (2) for or2	1 Woche	Do 27.02.14	Mi 05.03.14	190	163
165	**Module Tests**	**176 Tage**	**Mo 08.07.13**	**Mo 10.03.14**		
166	module i1 test	3 Tage	Mo 08.07.13	Mi 10.07.13	192	140
167	module i2 test	3 Tage	Mo 22.07.13	Mi 24.07.13	193	141
168	module i3 test	3 Tage	Mo 05.08.13	Mi 07.08.13	194	142
169	module i4 test	3 Tage	Mo 19.08.13	Mi 21.08.13	195	143
170	module i5 test	3 Tage	Mo 02.09.13	Mi 04.09.13	196	144
171	module i6 test	3 Tage	Mo 16.09.13	Mi 18.09.13	197	145
172	module i7 test	3 Tage	Mo 30.09.13	Mi 02.10.13	198	146
173	module i8 test	3 Tage	Mo 14.10.13	Mi 16.10.13	199	147
174	module ir1 test	3 Tage	Mo 21.10.13	Mi 23.10.13	200	148
175	module ir2 test	3 Tage	Mo 28.10.13	Mi 30.10.13	201	149
176	module ir3 test	3 Tage	Mo 04.11.13	Mi 06.11.13	201	150
177	module O1 test	3 Tage	Do 05.12.13	Mo 09.12.13	202	151
178	module O2 test	3 Tage	Do 12.12.13	Mo 16.12.13	203	152
179	module O3 test	3 Tage	Do 19.12.13	Mo 23.12.13	204	153
180	module O4 test	3 Tage	Do 26.12.13	Mo 30.12.13	205	154
181	module O5 test	3 Tage	Do 02.01.14	Mo 06.01.14	206	155
182	module O6 test	3 Tage	Do 09.01.14	Mo 13.01.14	207	156
183	module O7 test	3 Tage	Do 16.01.14	Mo 20.01.14	208	157
184	module O8 test	3 Tage	Do 23.01.14	Mo 27.01.14	209	158
185	module O9 test	3 Tage	Do 30.01.14	Mo 03.02.14	210	159
186	module O10 test	3 Tage	Do 06.02.14	Mo 10.02.14	211	160
187	module O11 test	3 Tage	Do 13.02.14	Mo 17.02.14	212	161
188	module O12 test	3 Tage	Do 20.02.14	Mo 24.02.14	213	162
189	module or1 test	3 Tage	Do 27.02.14	Mo 03.03.14	214	163
190	module or2 test	3 Tage	Do 06.03.14	Mo 10.03.14	215	164
191	**Kapton assembly (& te**	**175 Tage**	**Do 11.07.13**	**Mi 12.03.14**		
192	module i1	2 Tage	Do 11.07.13	Fr 12.07.13	217	166;248
193	module i2	2 Tage	Do 25.07.13	Fr 26.07.13	218	167
194	module i3	2 Tage	Do 08.08.13	Fr 09.08.13	219	168
195	module i4	2 Tage	Do 22.08.13	Fr 23.08.13	220	169
196	module i5	2 Tage	Do 05.09.13	Fr 06.09.13	221	170
197	module i6	2 Tage	Do 19.09.13	Fr 20.09.13	222	171
198	module i7	2 Tage	Do 03.10.13	Fr 04.10.13	223	172
199	module i8	2 Tage	Do 17.10.13	Fr 18.10.13	224	173
200	module ir1	2 Tage	Do 24.10.13	Fr 25.10.13	225	174
201	module ir1	2 Tage	Do 07.11.13	Fr 08.11.13	226	175;176
202	module o1	2 Tage	Di 10.12.13	Mi 11.12.13	227	177
203	module o2	2 Tage	Di 17.12.13	Mi 18.12.13	228	178
204	module o3	2 Tage	Di 24.12.13	Mi 25.12.13	229	179
205	module o4	2 Tage	Di 31.12.13	Mi 01.01.14	230	180
206	module o5	2 Tage	Di 07.01.14	Mi 08.01.14	231	181
207	module o6	2 Tage	Di 14.01.14	Mi 15.01.14	232	182
208	module o7	2 Tage	Di 21.01.14	Mi 22.01.14	233	183
209	module o8	2 Tage	Di 28.01.14	Mi 29.01.14	234	184
210	module o9	2 Tage	Di 04.02.14	Mi 05.02.14	235	185
211	module o10	2 Tage	Di 11.02.14	Mi 12.02.14	236	186
212	module o11	2 Tage	Di 18.02.14	Mi 19.02.14	237	187
213	module o12	2 Tage	Di 25.02.14	Mi 26.02.14	238	188
214	module or1	2 Tage	Di 04.03.14	Mi 05.03.14	239	189
215	module or2	2 Tage	Di 11.03.14	Mi 12.03.14	240	190
216	**Ladder glueing & Test**	**178 Tage**	**Mo 15.07.13**	**Mi 19.03.14**		
217	ladder i1	1 Woche	Mo 15.07.13	Fr 19.07.13		192
218	ladder i2	1 Woche	Mo 29.07.13	Fr 02.08.13		193
219	oadder i3	1 Woche	Mo 12.08.13	Fr 16.08.13		194
220	ladder i4	1 Woche	Mo 26.08.13	Fr 30.08.13		195
221	ladder i5	1 Woche	Mo 09.09.13	Fr 13.09.13		196
222	ladder i6	1 Woche	Mo 23.09.13	Fr 27.09.13		197
223	ladder i7	1 Woche	Mo 07.10.13	Fr 11.10.13		198
224	ladder i8	1 Woche	Mo 21.10.13	Fr 25.10.13	326	199
225	ladder ir1	1 Woche	Mo 28.10.13	Fr 01.11.13		200
226	ladder ir2	1 Woche	Mo 11.11.13	Fr 15.11.13		201
227	ladder o1	1 Woche	Do 12.12.13	Mi 18.12.13		202
228	ladder o2	1 Woche	Do 19.12.13	Mi 25.12.13		203
229	ladder o3	1 Woche	Do 26.12.13	Mi 01.01.14		204
230	ladder o4	1 Woche	Do 02.01.14	Mi 08.01.14		205
231	ladder o5	1 Woche	Do 09.01.14	Mi 15.01.14		206
232	ladder o6	1 Woche	Do 16.01.14	Mi 22.01.14		207
233	ladder o7	1 Woche	Do 23.01.14	Mi 29.01.14		208
234	ladder o8	1 Woche	Do 30.01.14	Mi 05.02.14		209
235	ladder o9	1 Woche	Do 06.02.14	Mi 12.02.14		210
236	ladder o10	1 Woche	Do 13.02.14	Mi 19.02.14		211
237	ladder o11	1 Woche	Do 20.02.14	Mi 26.02.14		212
238	ladder o12	1 Woche	Do 27.02.14	Mi 05.03.14	327	213
239	ladder or1	1 Woche	Do 06.03.14	Mi 12.03.14		214
240	ladder or2	1 Woche	Do 13.03.14	Mi 19.03.14		215
241	**1.4.2 Kapton link: Module-D**	**705 Tage**	**Fr 01.01.10**	**Do 13.09.12**		
249	**1.4.2.1 Patch Panel**	**615 Tage?**	**Fr 01.01.10**	**Do 10.05.12**		
253	**1.4.3.DHH**	**818 Tage?**	**Di 23.03.10**	**Do 09.05.13**		
259	**1.5 Mechanical Support**	**1000 Tage?**	**Fr 01.05.09**	**Do 28.02.13**		
263	**1.6 Thermal Issues**	**631 Tage?**	**Di 31.03.09**	**Di 30.08.11**		
266	**1.7 System**	**1172 Tage?**	**Mi 09.07.08**	**Do 03.01.13**		
310	**1.9 Cables**	**720 Tage**	**Di 01.02.11**	**Mo 04.11.13**		
314	**2.0 Test Systems**	**1379 Tage?**	**Di 01.07.08**	**Fr 11.10.13**		
325	**Intergration/Installation**	**237 Tage**	**Mo 04.11.13**	**Mi 01.10.14**		
326	mounting and test of 1st layer	2 Wochen	Mo 04.11.13	Fr 15.11.13	327	262;299;224
327	mounting and test of 2nd layer	2 Wochen	Do 06.03.14	Mi 19.03.14	328	326;238
328	system test	1 Monat	Do 20.03.14	Mi 16.04.14	329	327
329	BP/PXD/SVD completion	1,45 Monate	Do 01.05.14	Di 30.09.14	330	304;328
330	System ready for Belle II	0 Tage	Mi 01.10.14	Mi 01.10.14		329

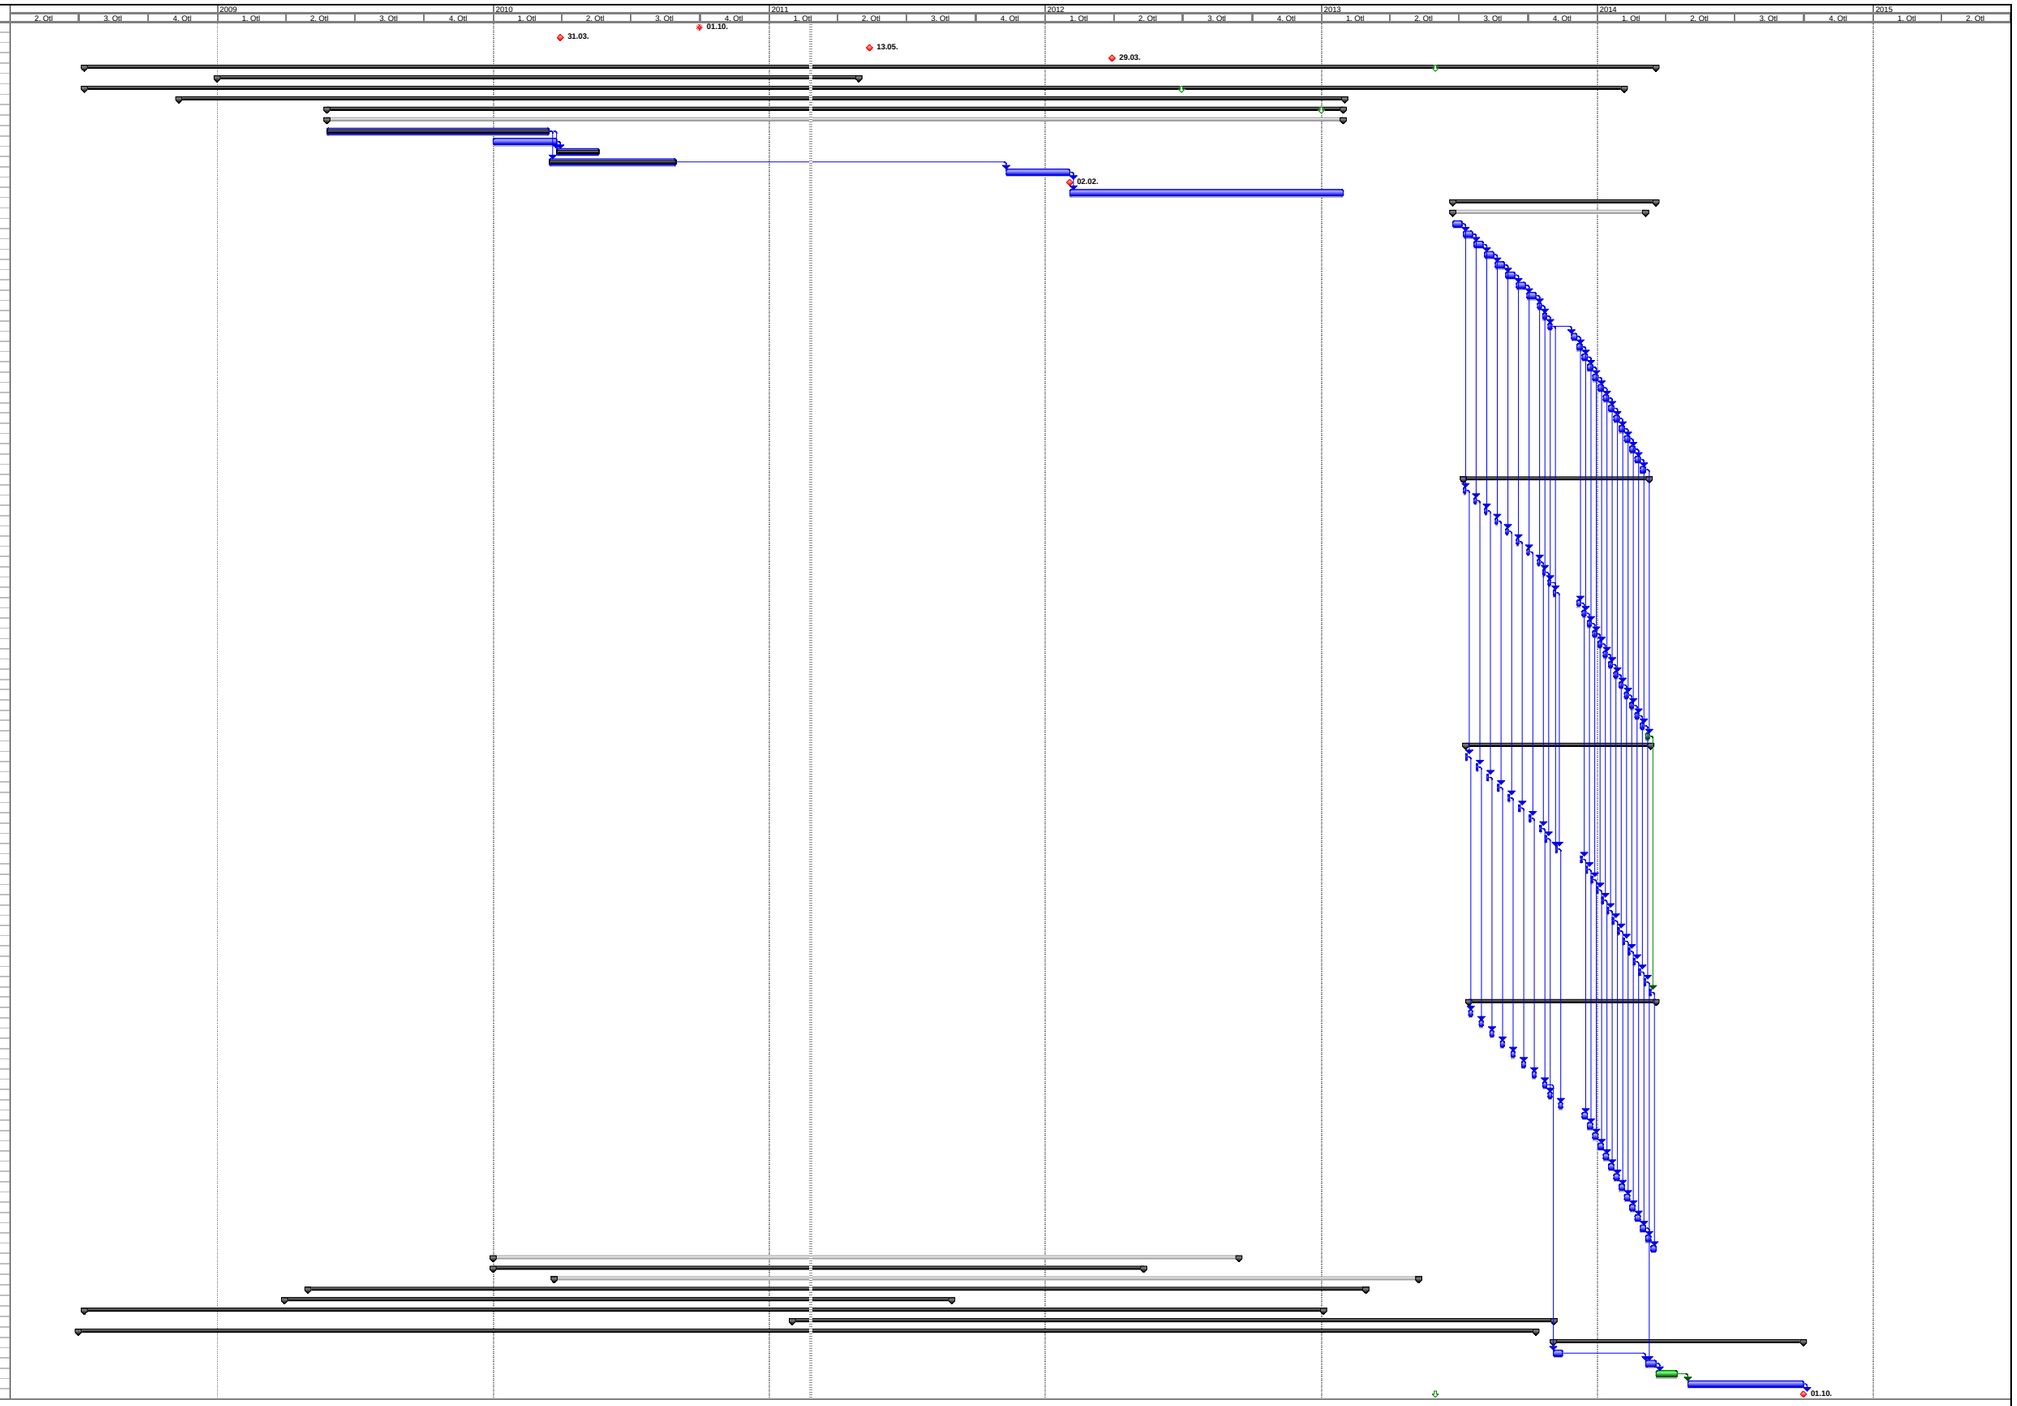

Project: Belle II Project January 2011 m
Date: Do 24.02.11

Task | Split | Progress | Milestone | Summary | Project Summary | External Tasks | External Milestone | Deadline
